

Gradnja kolektorja in podhoda
na Ajdovščini

Izgubljeni dnevi

Gradnja kolektorja in podhoda poteka po vnaprej predvidenem načrtu. Tekom samega izvajanja del pa so se pojavile nekajdnevne zamude, na katere pa izvajalec del, GP Gradis ni mogel vplivati in za te zamude tudi ne odgovarja. To je razvidno tudi iz analize opravljenih del, napravljene na zahtevo komisije za kontrolo nad izvajanjem del pri občinski skupščini, in ki se s to analizo strinja.

Problemi, ki so botrovali prekoračenjem predvidenih rokov pa so sledeči, je dejal inž. Vili Štrukelj, vodja gradbišča na Ajdovščini.

»Že takoj, v samem začetku gradnje, smo imeli težave pri odstranjevanju stare tramvajske proge. Tako je bilo treba opraviti celo nekaj razstrelitev, ki niso bile predvidene. Kljub temu pa to dodatno delo ni vplivalo na podaljšanje roka. Po

odstranitvi vrhnje plasti ceste smo naleteli na arheološke najdbe. Ker so bile te že vnaprej predvidene, je bila v časovnem planu tudi rezerva dni, namenjena arheološkim izkopavanjem. Prekoračitev tega roka pa je nastala zato, ker so bile plasti arheoloških najdb globlje, kot je bilo pričakovati in so tako tudi arheološka dela prekoračila rok za celih pet dni. To zato, ker v času izko-

pavanje ni bilo možno opravljati del na izgradnji podhoda in kolektorja.


Dalje je nastala izguba enega dne zaradi kasnejšega rušenja za to predvidene stavbe. Vendar pa moram povedati, da niso bile točne vesti v sredstvih javnega obveščanja, kjer so krivdo za zamudo valili na tistega privatnika, ki je opravil rušenje. On sam je svoje delo opravil v pogodbeno dogovorje-

nem roku, dan zamude pa je prišlo zato, ker investitor, Ljubljanski investicijski zavod ni v predvidenem roku izvajalcu odobril rušenja, to pa zopet zato, ker se zadnja stranka, stanujoča v omenjeni hiši, iz meni neznanih vzrokov, ni pravočasno izselila. Zadnja zamuda pa bi bila skoraj največja. Zagrebško podjetje, ki je predstavljalo primarni vodovod, je zaradi slabe koordinacije dela svoje delo opravilo nekako deset dni kasneje. Da bi vsaj nekaj teh izgubljenih dni nadoknadili, smo v tem času, ko so prestavljali vodovod, že začeli z deli, ki bi po planu prišla šele kasneje na vrsto. To nam je celotno gradnjo podražilo, oz. prišlo je do prekoračitve predvidenih stroškov. Smo pa na ta način zmanjšali zamudo, saj teh del kasneje seveda ne bo treba opravljati.

Deset dni prekoračitve za tak objekt pravzaprav ni veli-

ko, vendar se moramo zavedati, da smo z vsakim dnem, s katerim podaljšujemo rok, bliže zimi in seveda deževnim dnem. To pa nam utegne napraviti resne težave, saj v primeru dežja vse delo zamre. Tako nam je resno in trezno predočil sedanjo situacijo gradnje na Ajdovščini inženir Štrukelj.

Ob tem pa je še dodal, da se rokov v nobenem primeru ne da več krajšati, da bi tako pridobili že izgubljene dni. Tega namreč sam tehnološki postopek ne dovoljuje, kajti sedaj pride na vrsto gradnja, in pri tem seveda rabi beton toliko in toliko časa, da se kemično zveže in tega časa se nikakor ne more skrajšati. Pa tudi pri kakršnih koli ostalih, spremljevalnih delih ni niti najmanjše časovne rezerve, saj je bil že predvideni rok tako napet, da ni predvidel rezerv. (mj)

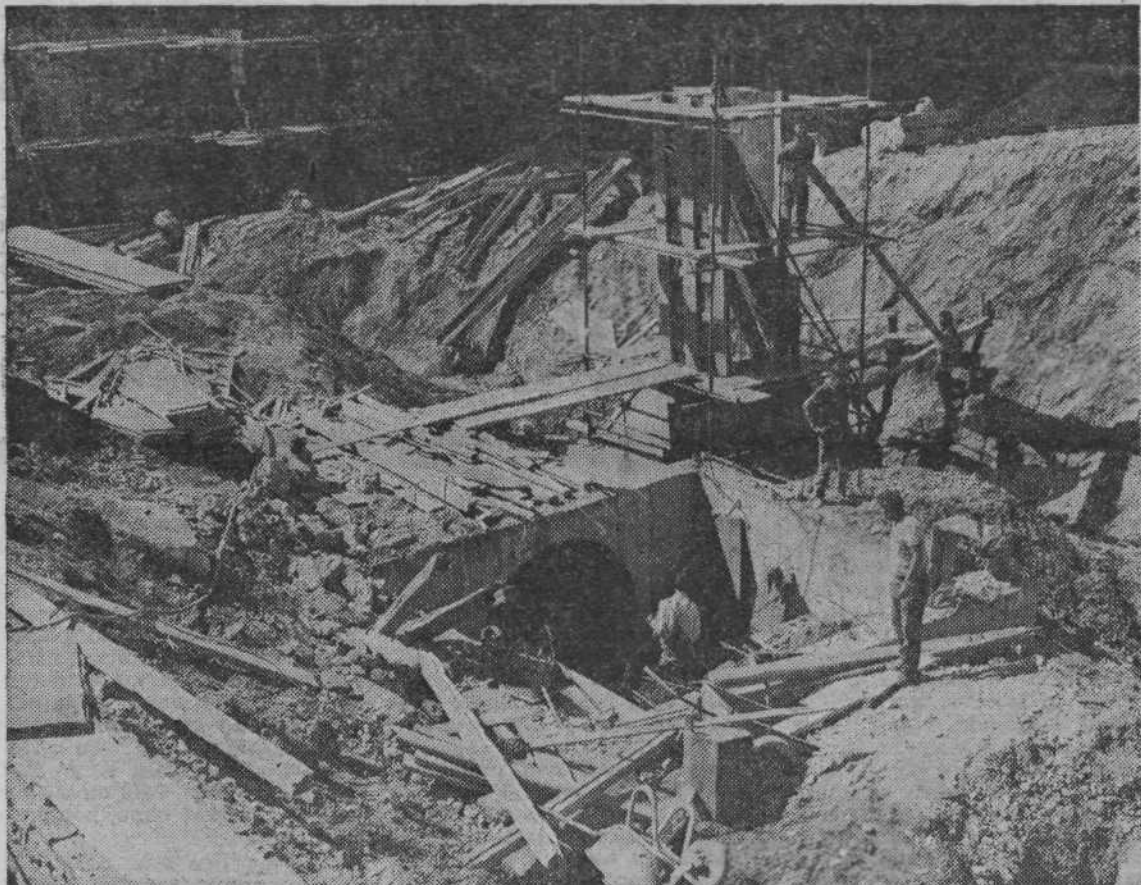

Spredaj eden od kolektorjev, za njim pa gradnja enega od nosilnih stebrov podhoda, ki so ga, zaradi zamud, pričeli postavljati pred rokom. V ozadju gradnja stene bodočega podhoda.



Delavci pri prenosu primarnega vodovoda, ki so povzročili del zamude. V ozadju izkop jame za podhod (pred Metalko).



Prestavitev primarnega vodovoda ni bila lahka stvar. Tako je človeški sili priskočil na pomoč tudi stroj.



Naš sogovornik, inž. Vili Štrukelj, pod njim eden od stebrov v gradnji.

Izdaja občinska konferenca SZDL, Ljubljana-Center — Ureja uredniški odbor: Jože Benčina, Ludvik Burger (gl. urednik), Lojze Cepuš, Vlado Krivokapič, Jože Šircelj (odg. urednik), Blaž Matekovič, Jože Pacek (predsednik ur. odbora), Tatjana Pust, Mišo Javornik, Franc Strle, Jože Šager, Rudi Veselič.

Tiska ČGP »DELO« — Časopis izhaja zadnji ponedeljek v mesecu — Oproščeno temeljnega davka po mnenju Sekretariata za informacije IS SRS z dne 13. II. 1973 številka 421—1/72
